

**Allegato 1 - Extra costi delle opere previste dal P.I.I.
e opere aggiuntive**



A2 - 1. Piazza pubblica

Tipo: Urbanizzazione secondaria

Costo : 3.818.473 €

Stato: da realizzare

Fine
lavori: dic. 2011

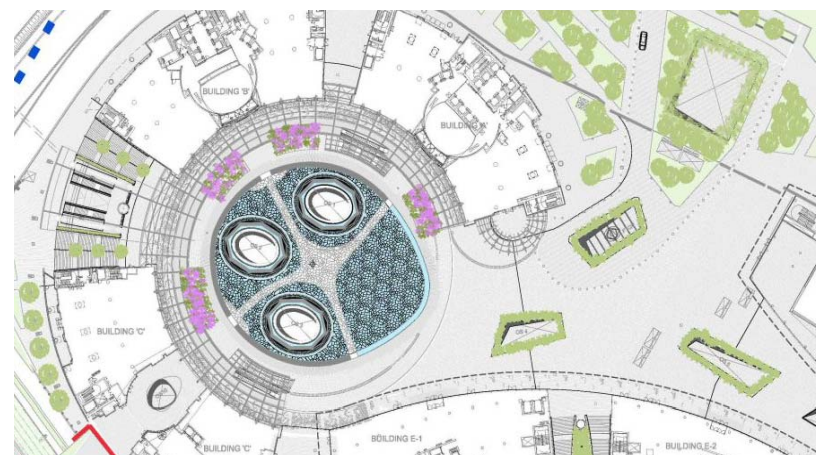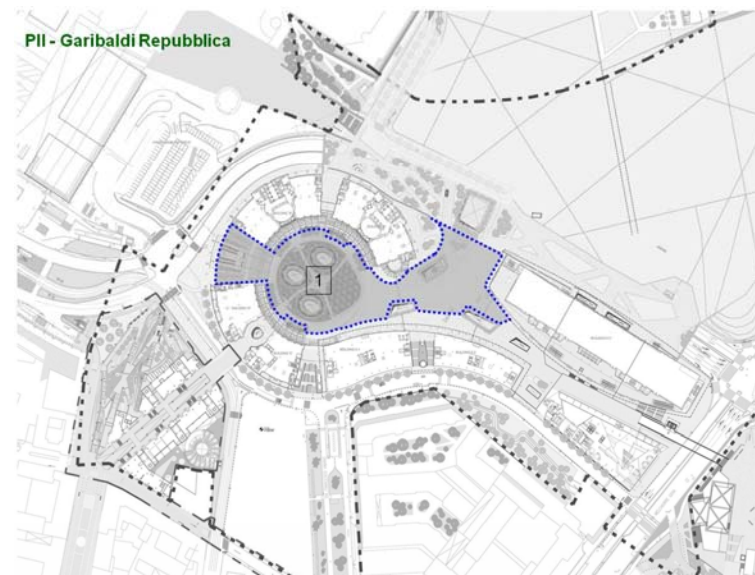



A2 - 2. Rampa di C.so Como

Tipo: Urbanizzazione secondaria

Costo : 1.065.292 €

Stato: da realizzare

Fine
lavori: ago. 2011

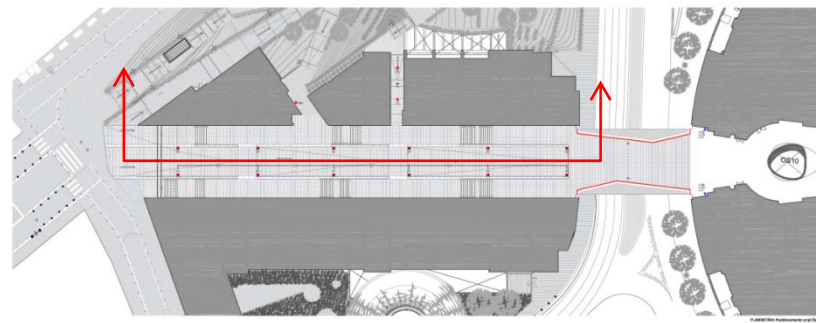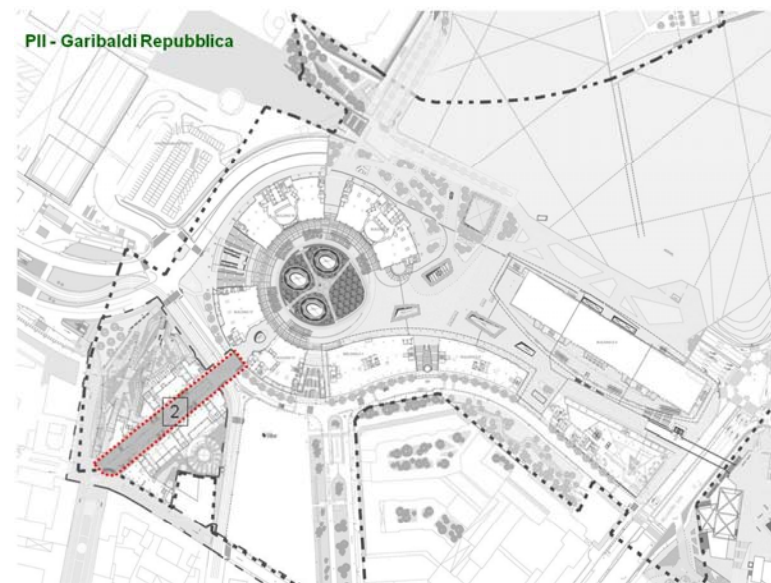



A3 - 1. Cunicolo sud + A3 - 2. Cunicolo nord

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 472.292€ + 114.765€ = 587.057 €

Stato: collaudato

Fine
lavori: sett. 2007

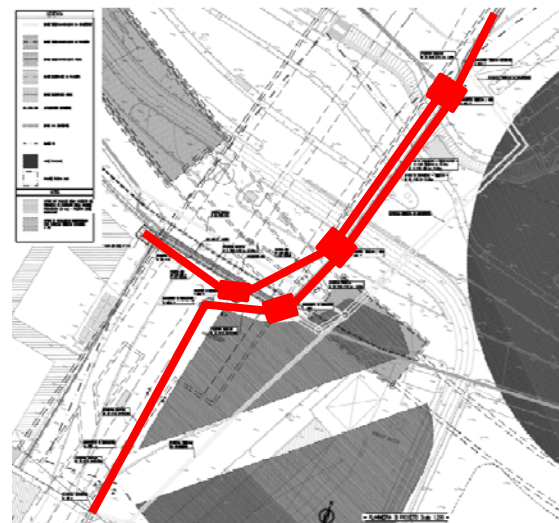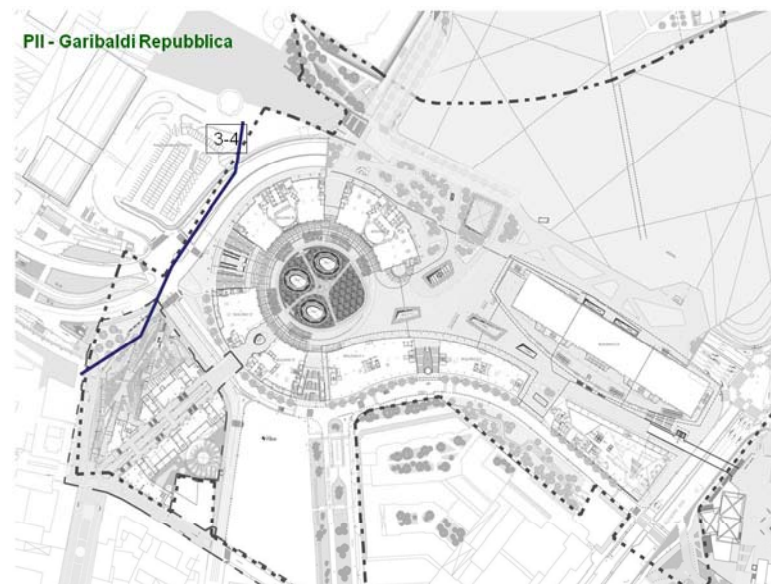


A3 - 3. Consolidamenti 4B

Tipo: Interferenze M5

Costo : 1.128.460€

Stato: Collaudata

Fine
lavori: apr.2008

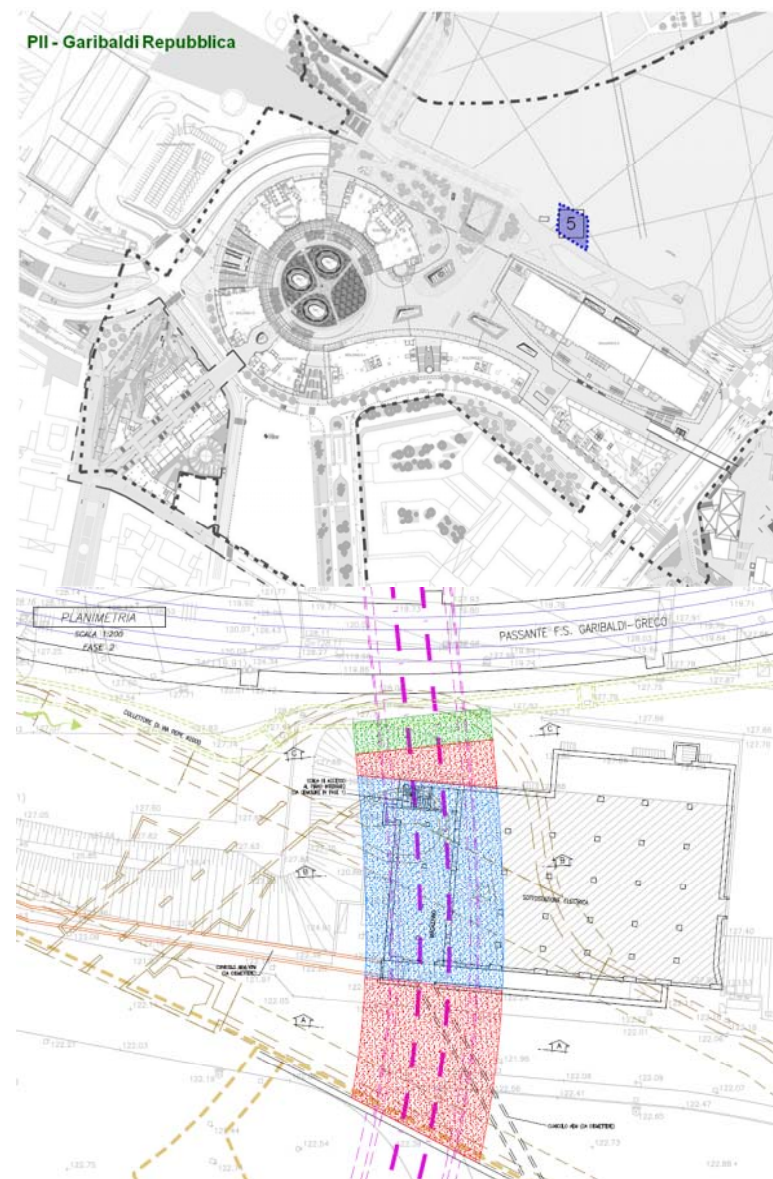

A3 - 4. Viabilità 2A ter

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 1.362.723€

Stato: Completata

Fine
lavori: lug. 2009



Viabilità provvisoria




A5 - 1. Tunnel Via del Nord + A5 - 2. Dorsale Fogna

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 10.958.085€ + 352.217€ +
+ 234.902€ = 11.545.204 €

Stato: aperto al traffico, da collaudare

Fine lavori: lug. 2009

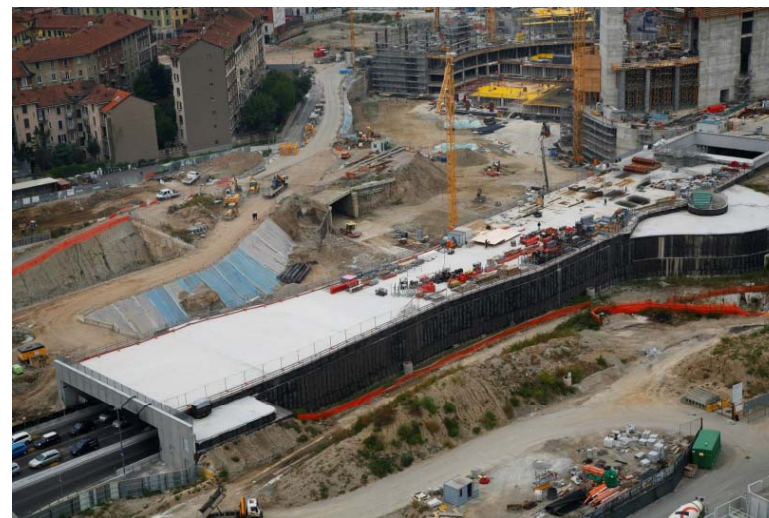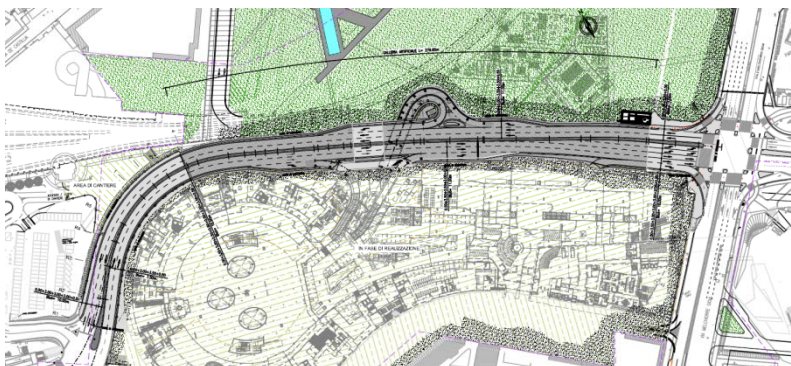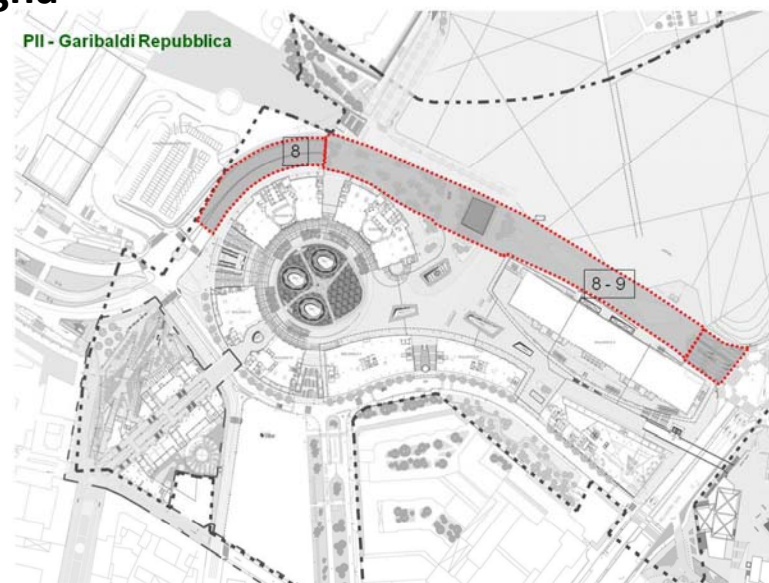

A6. Via del Sud


Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 2.594.885 €

Stato: in realizzazione

Fine

lavori: ott. 2011 strada
magg. 2012 giardino
mar. 2013 linea tram

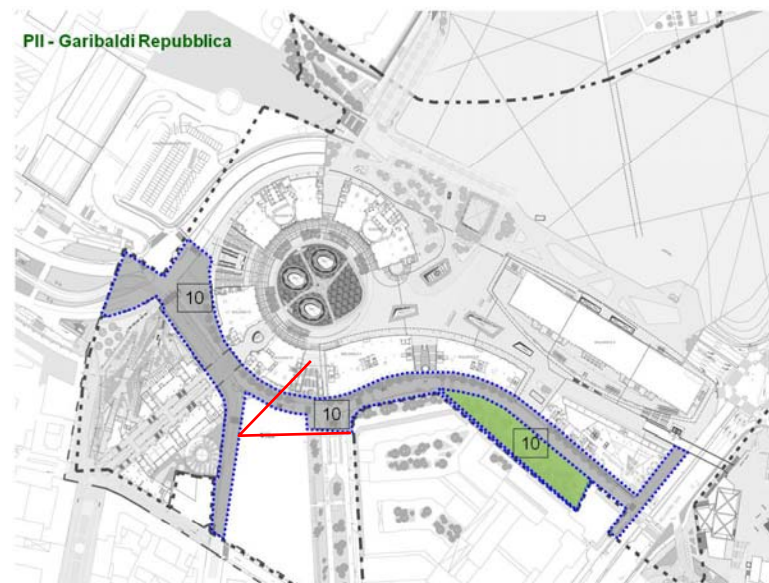


A7 -1. Strada di accesso al Podio

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 669.000 €

Stato: da realizzare

Fine
lavori: nov. 2011

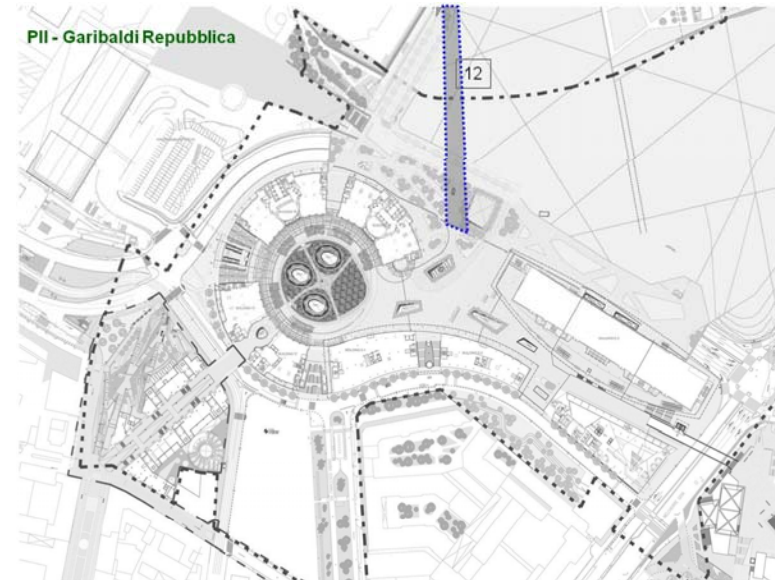



A7 - 2. Viabilità 1a/1b

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 855.103€

Stato: Completata

Fine
lavori: lug. 2009

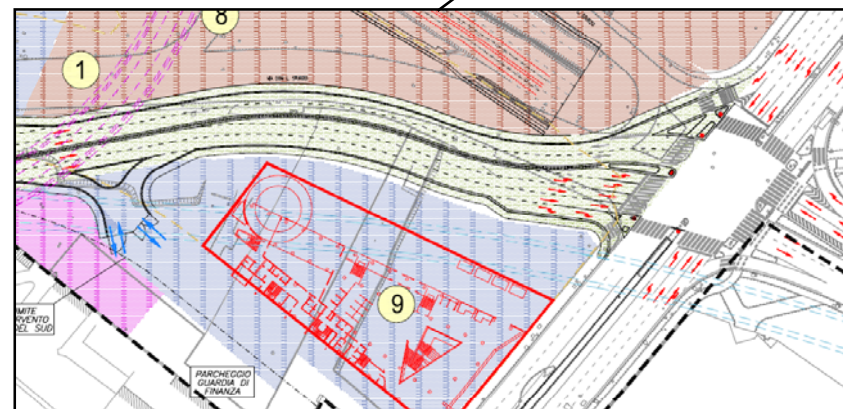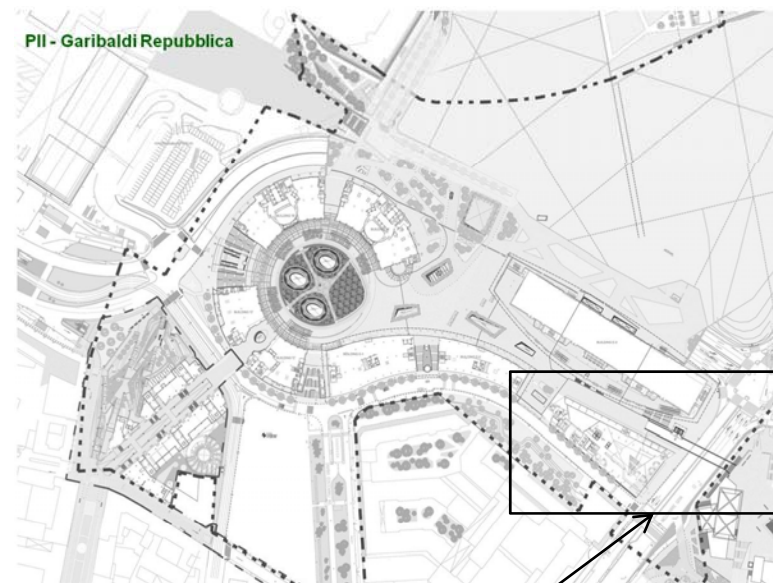




A8 - 1. Linea tranviaria

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 960.832€

Stato: da realizzare

Fine
lavori: ago. 2011

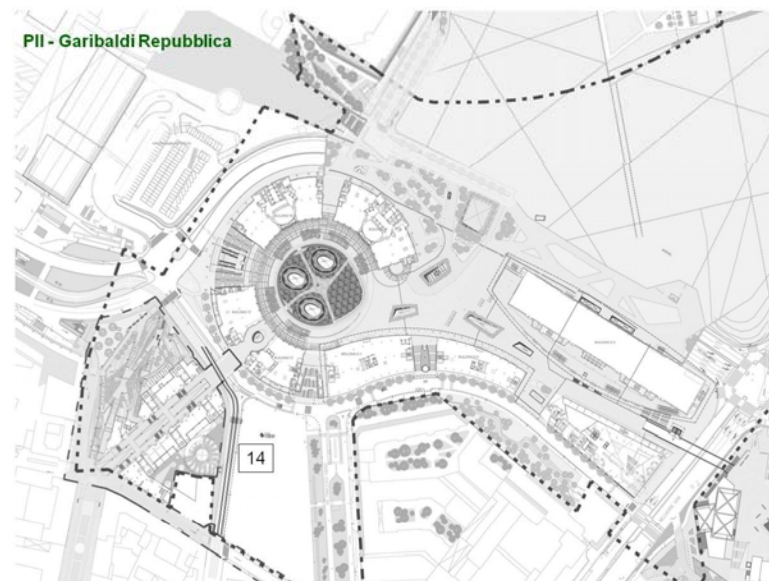


A8 - 2. Giardini di C.so Como

Tipo: Urbanizzazione primaria e secondaria

Costo : 1.106.559 €

Stato: da realizzare

Fine
lavori: ago. 2011

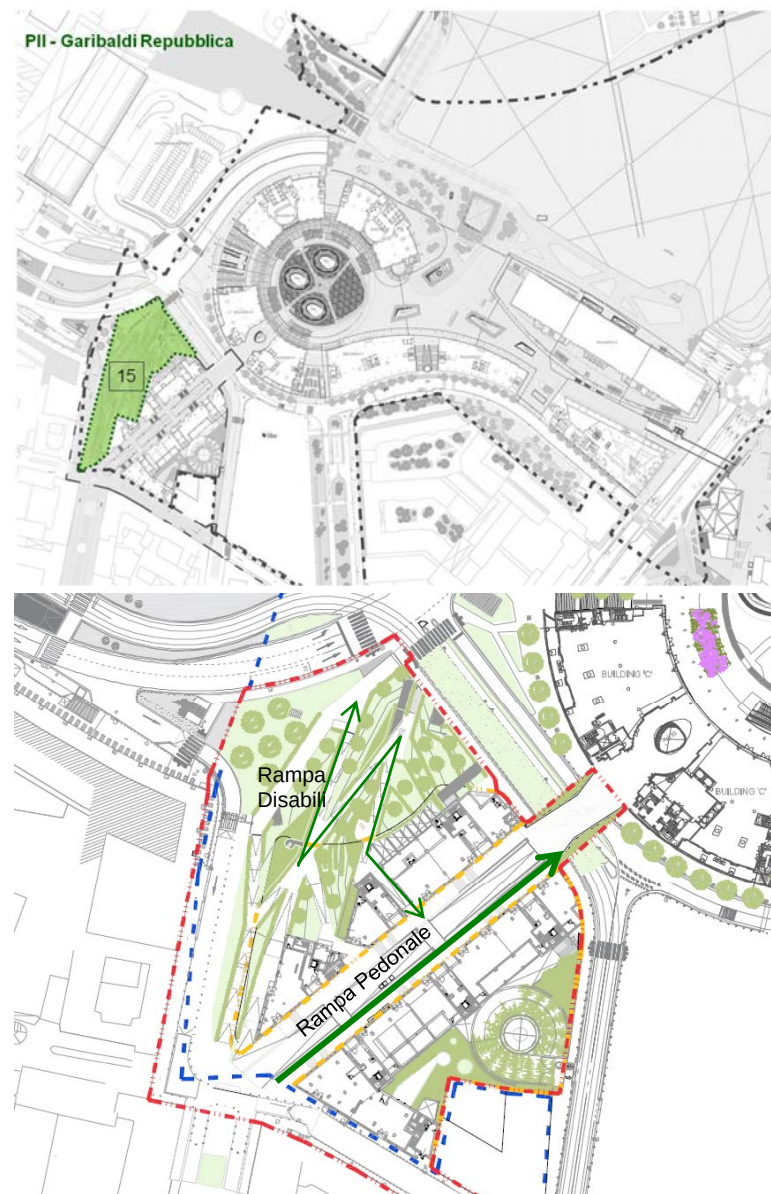


A8 - 3. Viabilità C.so Como

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 305.891€

Stato: da realizzare

Fine
lavori: ago. 2011

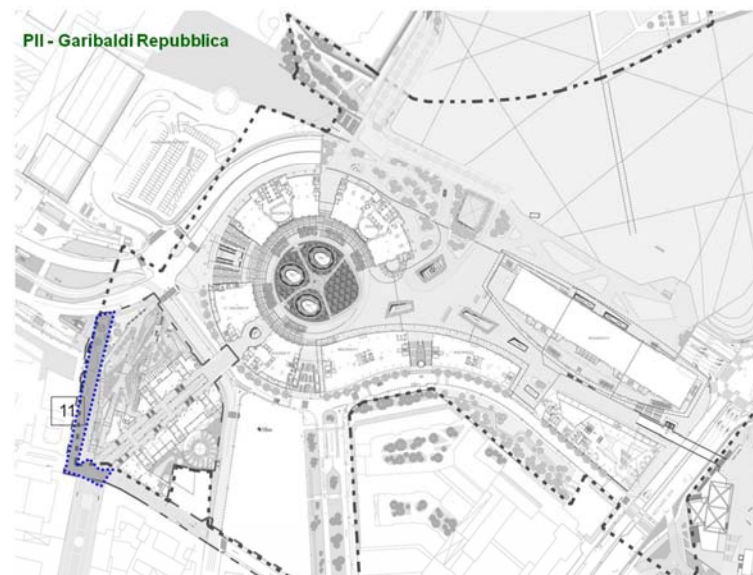

A9 . Sottostazione elettrica

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 2.366.851€

Stato: collaudato

Fine
lavori: nov. 2008




A10. Lampugnano

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 1.301.882 €

Stato: collaudato

Fine
lavori: magg. 2009

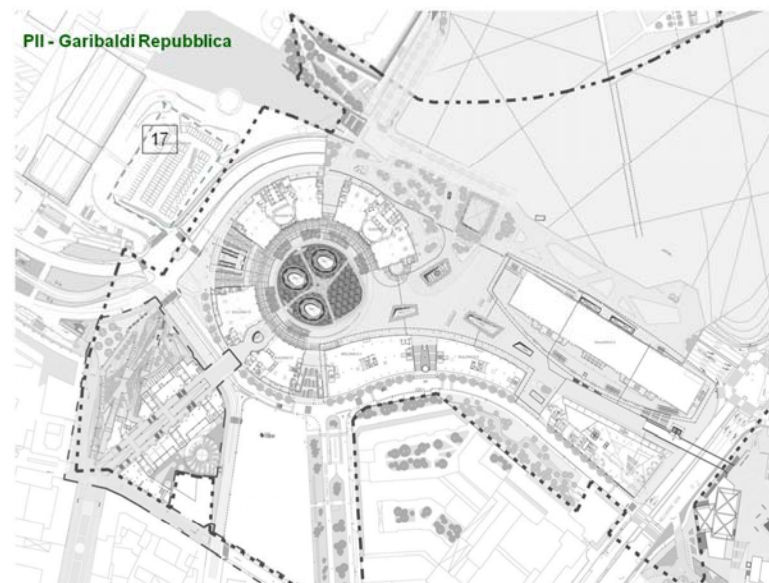

B1. Tunnel collegamento ipogeo

Tipo: Urbanizzazione primaria

Costo : 536.259 €

Stato : realizzato da collaudare

Fine lavori: lug. 2009

